

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
DAN RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN**



Nama Mata Kuliah : Manajemen Proyek Sistem Informasi

Kode / SKS : SI - 3017 / 2 SKS

Nama Dosen : Nurul Mutiah, S.T., M.T.

Jurusan : Sistem Informasi

**JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

2025

RPS DAN RPM MATA KULIAH MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI JURUSAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Informasi Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	: Manajemen Proyek Sistem Informasi
Jumlah Tatap Muka	: 16 x 100 menit
Bobot Kredit	: 2 SKS
Fakultas/Jurusan/Program	: MIPA/Sistem Informasi/S-1
Kode Mata Kuliah	: SI-3017
Status Mata Kuliah/Semester	: Wajib/III
Bentuk Pengajaran	: Kuliah Mimbar/Diskusi, Project Based Learning (PjBL)
Penilaian Mata Kuliah	: Presensi Mahasiswa (10%) Tugas (30%) UTS (30%) UAS (30%)
Dosen Pengampu	: Nurul Mutiah, S.T., M.T.

Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi mempelajari konsep dan praktek Manajemen Proyek baik secara umum maupun khusus pada bidang Sistem Informasi. Manajemen Proyek Sistem Informasi meliputi perencanaan, eksekusi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi proyek TI dalam upaya mencapai apa yang direncanakan sebelumnya baik dari sisi jadwal, biaya, dan ruang lingkup proyek. Untuk memahami bagaimana Manajemen Proyek Sistem Informasi dilakukan, maka akan dipelajari mengenai kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan pengelolaan proyek secara umum yakni PMBOK dan SCRUM. Penggunaan framework tersebut membuat standar pembelajaran Manajemen Proyek Sistem Informasi berdasarkan template umum yang dipakai pada manajemen proyek secara global. Berbagai tools manajemen proyek juga akan dideskripsikan sebagai pengantar alat bantu dalam melakukan manajemen proyek Sistem Informasi.

Tujuan Pembelajaran

Dengan mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep dasar manajemen proyek secara umum, memahami pelaksanaan praktikal dari manajemen

proyek berdasarkan siklus pada PMBOK, mampu mengestimasi nilai dan perencanaan jadwal proyek Sistem Informasi yang realistis, serta mampu menggunakan berbagai tools manajemen proyek.

Buku Teks

- [1].Project Management Institutes. (2017). *A Guide to Project Management Body of Knowledge: Sixth Edition*. Project Management Institutes.

Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi

		UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PRODI SISTEM INFORMASI			Kode Dokumen		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tanggal Penyusunan	
Manajemen Proyek Sistem Informasi	SI - 3017	IS Project Management	T=2	P=0	3	24 Juni 2025	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI		
	Nurul Mutiah, S.T., M.T.		Nurul Mutiah, S.T., M.T.		Renny Puspita Sari, S.T., M.T.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL04						
	CPL09						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					CPL yang didukung	
	CPMK041						CPL04
	CPMK042						CPL04
	CPMK043						CPL04
	CPMK091						CPL09
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					CPMK yang didukung	
	Sub-CPMK0413	Mahasiswa mampu memahami Manajemen, Sistem Informasi, Proyek dan Program					CPMK041
	Sub-CPMK0414	Mahasiswa mampu memahami Kesuksesan Proyek dan Siklus Hidup Proyek					CPMK041
	Sub-CPMK0415	Mahasiswa mampu mendeskripsikan area pengetahuan manajemen proyek berdasarkan PMBOK					CPMK041

	Sub-CPMK0416	Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan berbagai metodologi proyek khususnya Scrum, serta dapat menyesuaikannya untuk proyek dengan ruang lingkup yang tepat		CPMK041
	Sub-CPMK0421	Mahasiswa mampu memilih proyek berdasarkan perhitungan, Pacback Period, Return on Investment, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Analisa Biaya Breakeven		CPMK042
	Sub-CPMK0422	Mahasiswa mampu membuat estimasi biaya dan penganggaran serta penjadwalan biaya		CPMK042
	Sub-CPMK0423	Mahasiswa mampu memahami Perencanaan dan Penjadwalan Proyek (Manajemen Waktu)		CPMK042
	Sub-CPMK0424	Mahasiswa mampu Menyusun dan menguraikan materi kualitas proyek perangkat lunak beserta metriknya.		CPMK042
	Sub-CPMK0425	Mahasiswa mampu Memahami dan dapat menguraikan kembali Manajemen Resiko, Toleransi terhadap Resiko, Proses Manajemen Resiko		CPMK042
	Sub-CPMK0431	Mahasiwa dapat melakukan Praktek Evaluasi Proyek dengan kajian seperti Tahap Evaluasi Proyek, Dimensi kerja, Framework Evaluasi Proyek, Pemilihan Indikator, Identifikasi Sumber Daya Potensial		CPMK043
	Sub-CPMK0911	Mahasiswa mampu membuat dokumen Project Charter dan mendeskripsikan komponennnya dengan komprehensif sesuai dengan tema proyek sistem informasi yang diangkat.		CPMK091
Pemetaan CPL-CPMK		CPL04	CPL09	Poin Penilaian
	CPMK041	X		32
	CPMK042	X		28
	CPMK043	X		27
	CPMK091		X	13
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi mempelajari konsep dan praktek Manajemen Proyek baik secara umum maupun khusus pada bidang Sistem Informasi. Manajemen Proyek Sistem Informasi meliputi perencanaan, eksekusi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi proyek TI dalam upaya mencapai apa yang direncanakan sebelumnya baik dari sisi jadwal, biaya, dan ruang lingkup proyek. Pada dasarnya, Manajemen Proyek Sistem Informasi mendukung agar proyek Teknologi Informasi dapat memberikan ROI yang telah dijanjikan dan memberikan nilai tambah bagi pemilik proyek. Untuk memahami bagaimana Manajemen Proyek Sistem Informasi dilakukan, maka akan dipelajari mengenai kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan pengelolaan proyek secara umum yakni PMBOK dan SCRUM. Penggunaan framework tersebut membuat standar pembelajaran Manajemen Proyek Sistem Informasi berdasarkan template umum yang dipakai pada manajemen proyek secara global. Berbagai tools manajemen proyek juga akan dideskripsikan sebagai pengantar alat bantu dalam melakukan manajemen proyek Sistem Informasi.			
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	a. Definisi dan Siklus Manajemen Proyek b. Proses Manajemen Proyek c. Project Integration Management d. Analisis Kelayakan Ekonomi Proyek			

	e. Pengukuran Biaya Pengembangan Proyek Sistem Informasi f. Project Schedule Management g. Project Quality Management h. Project Risk Management i. Evaluasi Proyek j. Scrum Project Management
Pustaka	Utama:
	[1]. Project Management Institutes. (2017). <i>A Guide to Project Management Body of Knowledge: Sixth Edition</i> . Project Management Institutes.
	Pendukung:
Media Pembelajaran	Trello, Microsoft Project, Draw.io Microsoft Power Point, Edlink, Microsoft Word
Team Teaching	Nurul Mutiah, S.T., M.T.
Matakuliah syarat	-

Rencana Pembelajaran Mingguan Mata Kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
1	Sub-CPMK0413 Mahasiswa mampu memahami Manajemen, Sistem Informasi, Proyek dan Program	1. Mahasiswa mampu menjelaskan secara singkat silabus Manajemen Proyek Sistem Informasi 2. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya Manajemen Proyek Sistem Informasi 3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan alur sejarah Manajemen Proyek	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes	Kuliah Mimbar [TM: 2x50 menit]		Yang dilakukan mahasiswa : - Mendengarkan dan mencatat. - Berdiskusi. Yang dilakukan dosen : - Menjelaskan di depan kelas. - Berdiskusi	- Silabus Manajemen Proyek Sistem Informasi - Konsep dan aturan perkuliahan - Pendahuluan Manajemen Proyek	Bobot : 0 %
2	Sub-CPMK0414 Mahasiswa mampu memahami Kesuksesan	1. Mahasiswa mampu menjelaskan siklus hidup dan ketergantungan antar tahapan proyek Sistem Informasi	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes	Kuliah Mimbar [TM: 2x50 menit]		Yang dilakukan mahasiswa : - Mendengarkan dan mencatat. - Berdiskusi.	Definisi dan Siklus Manajemen Proyek: - Definisi Proyek - Interaksi Manajemen Portofolio, Proyek, Program	Bobot : 1%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
	Proyek dan Siklus Hidup Proyek	2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh antar komponen segitiga proyek dalam hasil proyek 3. Mahasiswa mampu membedakan berbagai struktur proyek dalam organisasi				Yang dilakukan dosen : - Menjelaskan di depan kelas. - Berdiskusi	- Siklus Hidup Proyek TI - Definisi Manajemen Proyek - Proses dan Prosedur Pelaksanaan Proyek - Segitiga Manajemen Proyek - Pengaruh Bentuk Organisasi Pada Manajemen Proyek	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
3	Sub-CPMK0415 Mahasiswa mampu mendeskripsikan area pengetahuan manajemen proyek berdasarkan PMBOK	1. Mahasiswa mampu menjelaskan proses manajemen proyek pada PMBOK. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor kesuksesan dan kegagalan sebuah proyek 3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai input, proses, dan output pada knowledge area PMBOK	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes	Kuliah Mimbar [TM: 2x50 menit]		Yang dilakukan mahasiswa : - Mendengarkan, membaca mencatat - Berdiskusi - Mengerjakan latihan-latihan soal Yang dilakukan dosen : - Menjelaskan di depan kelas - Berdiskusi - membimbing mahasiswa dalam mengerjakan latihan-latihan soal	Proses Manajemen Proyek: - Siklus Umum Manajemen Proyek - Kelompok Proses Manajemen Proyek beserta interaksinya - Workflow Diagram Manajemen Proyek - Kegagalan sebuah Proyek - Kesuksesan sebuah Proyek - Proses Manajemen Proyek dan PMBOK - Framework Manajemen Proyek	Bobot: 1%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
							- Knowledge Area Manajemen Proyek	
4	Sub-CPMK0911 Mahasiswa mampu membuat dokumen Project Charter dan mendeskripsikan komponennnya dengan komprehensif sesuai dengan tema proyek	1. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan manajemen integrasi proyek sebagai backbone PMBOK 2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai dokumen input dan output dari proses manajemen integrasi proyek	Bentuk penilaian: Performance Test (sikap/keterampilan) Kriteria: Kemampuan merespon, mengorganisasi dan mengikuti	PjBL [TM: 2x50 menit] Tugas Proyek Membuat Dokumen Project Charter		Tahap 1: Penentuan Pertanyaan Mendasar 1. Dosen bersama mahasiswa menelaah masalah kebutuhan Proyek Sistem Informasi	Project Integration Management: - Komponen Project Integration Management - Input dan output dari Proses Project Integration Management - Tools dan Teknik dari Proses Project Integration Management	Bobot : 10% dari 15% Nilai Tugas

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
	sistem informasi yang diangkat.	3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan komponen dari dokumen awal proyek yakni Project Charter 4. Mahasiswa mampu menentukan tema proyek sistem informasi yang akan dibuat dokumen project charternya.	setiap tahapan desain proyek PjBL dengan tepat	[PT+BM: (2x50') + (2x50')]		sebuah organisasi 2. Dosen bersama mahasiswa menetapkan n komponen project charter yang akan dibuat Tahap 2: Mendesain perencanaan proyek 3. Dosen bersama mahasiswa berdiskusi tentang materi yang perlu dipersiapka n	- Template Laporan dari dari Output Project Integration Management yakni Dokumen Project Charter	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
						4. Mahasiswa mendesain cara menyelesaikan proyek Tahap 3: Menyusun jadwal 5. Mahasiswa menyusun jadwal penyelesaian desain dan implementasi dalam 2 minggu 6. Dosen menjelaskan tentang tata cara penilaian Proyek yang dilakukan mahasiswa		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
5	Sub-CPMK0911 Mahasiswa mampu membuat dokumen Project Charter dan mendeskripsikan komponennnya dengan komprehensif sesuai dengan tema proyek sistem informasi yang diangkat.	1. Mahasiswa mampu membuat dokumen awal proyek yakni Project Charter dan mendeskripsikan komponen secara tepat berdasarkan tema proyek Sistem Informasi yang diangkat	Bentuk penilaian: Performance Test (sikap/keterampilan) Tanya jawab Kriteria: Kemajuan pengerjaan proyek: - Menampilka n draft dokumen Project Charter (Identifikasi Kemajuan Isi setiap komponen	PjBL [TM: 2x50 menit] Tugas Proyek Membuat Dokumen Project Charter [PT+BM: (3x50') + (3x50')]		Tahap 4: Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek 1. Dosen mengevalua si kemajuan Proyek pembuatan dokumen project, persentase pengerjaan proyek dan bagian yang masih belum dimengerti 2. Mahasiswa mereview desain yang	Sistematika penulisan laporan Project Integration Management (Project Charter): 1. Membuat Ringkasan Eksekutif 2. Menulis deskripsi setiap komponen Project Charter 3. Membuat struktur proyek 4. Membuat deskripsi peran dan tanggungjawab stakeholder proyek	Bobot : 30% dari 15% Nilai Tugas

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
			Project Charter) - Kemampuan menuliskan komponen dokumen Project Charter dengan jelas dan lengkap sesuai dengan tema proyek Sistem Informasi yang diangkat			telah dibuat (on - progress) Metode diskusi 1. Dosen menjelaskan dan memberikan contoh cara penulisan komponen - komponen dokumen project charter 2. Dosen dan mahasiswa berdiskusi mengenai bagian - bagian dasar dokumen project		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
						charter yang telah dibuat		
6	Sub-CPMK0911 Mahasiswa mampu membuat dokumen Project Charter dan mendeskripsikan komponennnya dengan komprehensif sesuai dengan tema proyek sistem informasi yang diangkat.	1. Mahasiswa mampu mengumpulkan dokumen project charter dengan tepat waktu 2. Mahasiswa mampu mempresentasikan dokumen proyek yang telah dibuat 3. Mahasiswa mampu menjelaskan setiap input, tools, dan output yang terdapat pada dokumen proyek 4. Mahasiswa mampu memvalidasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen proyek	Bentuk penilaian: Performance Test (keterampilan): - Mengumpulkan dokumen dan mempresentasikan di forum kelas Kriteria: - Ketepatan menganalisa dan mendeskripsikan komponen project charter sesuai dengan tema proyek system	PjBL [TM: 2x50 menit]	Presentasi Project Charter	PjBL Tahap 5: Menguji hasil 1. Mahasiswa memaparkan hasil penulisan dokumen project charter masing-masing dan menerima tanya jawab tentang produk proyek Tahap 6: Mengevaluasi pengalaman	PRESENTASI DOKUMEN PROJECT CHARTER	Bobot : Pengumpulan Dokumen: 40% dari 15% Nilai Tugas Presentasi: 20% dari 15% Nilai Tugas

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
			informasi yang diangkat			- Dosen membagikan lembar refleksi penyelesaian proyek dengan metode SWOT analysis disertai Tindakan		
7	Sub-CPMK0423 Mahasiswa mampu memahami Perencanaan dan Penjadwalan Proyek	1. Mahasiswa mampu mengkategorisasi aktifitas proyek menjadi kelompok utama. 2. Mahasiswa mampu memecah aktifitas utama proyek menjadi aktifitas turunannya. 3. Mahasiswa mampu memprediksi durasi setiap aktifitas	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes	Kuliah Mimbar [TM: 2x50 menit]		Yang dilakukan mahasiswa : - Mendengarkan, membaca mencatat - Berdiskusi - Mengerjakan latihan-latihan soal Yang dilakukan dosen : - Menjelaskan di depan kelas	Project Schedule Management: - Komponen Project Schedule Management - Input dan output dari Proses Project Schedule Management - Tools dan Teknik dari Proses Project Schedule Management	Bobot : 2%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
		proyek sesuai ruang lingkup proyek. 4. Mahasiswa mampu menuangkan aktifitas dan durasinya kedalam bentuk diagram penjadwalan proyek.				- Berdiskusi - membimbing mahasiswa dalam mengerjakan latihan-latihan soal	- Template Laporan dari dari Output Project Schedule Management: - o Activity List - o Activity Attribute - o Activity Milestone - o Schedule Baseline - o Work Breakdown Structure - o Gantt Chart	
8	Ujian Tengah Semester Sub-CPMK0413, Sub-CPMK0414, Sub-CPMK0415, Sub-CPMK0423, Sub-CPMK0911 Bobot: 30%							

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
9	Sub-CPMK0421 Mahasiswa mampu memilih proyek berdasarkan perhitungan, Pacback Period, Return on Investment, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Analisa Biaya Breakeven	1. Mahasiswa mampu menganalisa perkiraan pengeluaran dan pendapatan dari proyek 2. Mahasiswa mampu melakukan berbagai Analisa kelayakan ekonomi untuk menilai peluang kesuksesan proyek 3. Mahasiswa mampu memvalidasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen proyek	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes	Kuliah Mimbar [TM: 2x50 menit]		Yang dilakukan mahasiswa : - Mendengarkan, membaca mencatat - Berdiskusi - PRESENTASI DOKUMEN PROJECT SCHEDULE MANAGEMEN T Yang dilakukan dosen : - Menjelaskan di depan kelas - Berdiskusi - membimbing mahasiswa dalam mengerjakan latihan-latihan soal	Analisis Kelayakan Ekonomi: - Analisis Payback (Payback Peroid) - Analisis Net Present Value - Return On Investment (ROI) - Internal Rate of Return (IRR)	Bobot : 2%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
10	Sub-CPMK0422 Mahasiswa mampu membuat estimasi biaya dan penganggaran serta penjadwalan biaya dan peramalan	1. Mahasiswa mampu membuat Use Case proyek. 2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan proses CRUD dalam proyek Sistem Informasi yang akan dibangun. 3. Mahasiswa mampu mengukur biaya proyek sesuai dengan cakupan ruang lingkup proyek	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes	Kuliah Mimbar [TM: 2x50 menit]		Yang dilakukan mahasiswa: - Mendengarkan, membaca mencatat - Berdiskusi - Mengerjakan latihan-latihan soal Yang dilakukan dosen : - Menjelaskan di depan kelas - Berdiskusi - Membimbing mahasiswa dalam mengerjakan latihan-latihan soal	Analisis Function Point - Jenis Pengukuran Biaya Software - Internal Measurement - External Measurement - Metodologi Evaluasi Software - Tahapan Melakukan Function Point - Studi Kasus Pengukuran Biaya Pembangunan Software	Bobot: 2%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
11	Sub-CPMK0424 Mahasiswa mampu Menyusun dan menguraikan materi kualitas proyek perangkat lunak beserta metriknya dan proses komunikasinya.	1 Mahasiswa mampu mendeskripsikan metrik pengukuran kualitas perangkat lunak. 2 Mahasiswa mampu mendeskripsikan tahapan input, tools, dan output manajemen kualitas proyek. 3 Mahasiswa mampu membuat dokumen proyek mengenai manajemen kualitas. 4 Mahasiswa mampu menilai, memvalidasi, dan memperbaiki dokumen proyek yang telah dibuat.	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes	Kuliah Mimbar [TM: 2x50 menit]		Yang dilakukan mahasiswa: - Mendengarkan, membaca dan mempelajari bahan ajar, mencatat, - PRESENTASI ANALISIS FUNCTION POINT - Berdiskusi. Yang dilakukan dosen: - Menjelaskan di depan kelas, - membimbing mahasiswa dalam mengerjakan latihan-latihan soal,	Project Quality Management: - Komponen Project Quality Management - Input dan output dari Proses Project Quality Management - Tools dan Teknik dari Proses Project Quality Management - Software Quality Measurement Template Laporan dari Output Project Quality Management	Bobot: 2%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
						- Berdiskusi		
12	Sub-CPMK0424 Mahasiswa mampu Menyusun dan menguraikan materi kualitas proyek perangkat lunak beserta metriksnya dan proses komunikasinya.	1 Mahasiswa mampu merencanakan proses komunikasi proyek yang efektif. 2 Mahasiswa mampu mendeskripsikan tahapan input, tools, dan ouput manajemen komunikasi proyek. 3 Mahasiswa mampu membuat dokumen proyek mengenai manajemen komunikasi. 4 Mahasiswa mampu menilai, memvalidasi, dan memperbaiki	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes	Kuliah Mimbar [TM: 2x50 menit]		Yang dilakukan mahasiswa: - Mendengarkan, membaca dan mempelajari bahan ajar, mencatat, - PRESENTASI DOKUMEN PROJECT QUALITY MANAGEMEN T - Berdiskusi. Yang dilakukan dosen : - Menjelaskan di depan kelas, - membimbing mahasiswa	Project Communication Management: - Komponen Project Communication Management - Input dan output dari Proses Project Communication Management - Tools dan Teknik dari Proses Project Communication Management Template Laporan dari dari Output Project Communication Management	Bobot: 1%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
		dokumen proyek yang telah dibuat.				dalam mengerjakan latihan-latihan soal, - Berdiskusi		
13	Sub-CPMK0425 Memahami dan dapat menguraikan kembali Manajemen Resiko, Toleransi terhadap Resiko, Proses Manajemen Resiko	1 Mahasiswa mampu menganalisa kemungkinan resiko proyek yang akan terjadi. 2 Mahasiswa mampu memetakan dampak resiko kedalam kategori resiko 3 Mahasiswa mampu membuat strategi mitigasi resiko proyek. 4 Mahasiswa mampu mendeskripsikan tahapan input, tools, dan ouput	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes	Kuliah Mimbar [TM: 2x50 menit]		Yang dilakukan mahasiswa : PRESENTASI DOKUMEN PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT - Mendengarkan, membaca dan mempelajari bahan ajar, mencatat, - Berdiskusi. Yang dilakukan dosen :	Project Risk Management: - Komponen Project Risk Management - Input dan output dari Proses Project Risk Management - Tools dan Teknik dari Proses Project Risk Management - Template Laporan dari dari Output Project Risk Management	Bobot : 1%


Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
		manajemen resiko proyek. 5 Mahasiswa mampu membuat dokumen proyek mengenai manajemen resiko. 6 Mahasiswa mampu menilai, memvalidasi, dan memperbaiki dokumen proyek yang telah dibuat.				- Menjelaskan di depan kelas, - membimbing mahasiswa dalam mengerjakan latihan-latihan soal, - Berdiskusi		
14	Sub-CPMK0431 Mahasiswa dapat melakukan Praktek Evaluasi Proyek dengan kajian seperti Tahap Evaluasi Proyek, Dimensi kerja, Framework Evaluasi Proyek, Pemilihan Indikator,	1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan indikator kinerja evaluasi proyek. 2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan Teknik yang tepat dalam pengumpulan data evaluasi. 3. Mahasiswa mampu membuat dokumen proyek mengenai evaluasi proyek.	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes		Kuliah Mimbar [TM: 2x50 menit]	Yang dilakukan mahasiswa : PRESENTASI DOKUMEN PROJECT RISK MANAGEMENT - Mendengarkan, membaca dan mempelajari bahan ajar, mencatat, - Mengerjakan latihan-latihan	Dasar Evaluasi Proyek - Definisi Evaluasi - Tujuan Evaluasi Proyek - Keuntungan Evaluasi Proyek - Pertanyaan Evaluasi - Mengelola sebuah Evaluasi	Bobot : 1%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
	Identifikasi Sumber Daya Potensial	4. Mahasiswa mampu menilai, memvalidasi, dan memperbaiki dokumen proyek yang telah dibuat.				soal di buku atau di papan tulis, - Berdiskusi. Yang dilakukan dosen : - Menjelaskan di depan kelas, - membimbing mahasiswa dalam mengerjakan latihan-latihan soal, - Berdiskusi	• Pihak yang terlibat dalam evaluasi • Peran dan tanggung jawab evaluator • Tahap Evaluasi Proyek • Dimensi kerja • Framework Evaluasi Proyek • Pemilihan Indikator • Identifikasi Sumber Daya Potensial • Metode dan Instrumen Pengumpulan Data	
15	Sub-CPMK0416 Mahasiswa mampu menjelaskan	1. Mahasiswa mampu memahami struktur proyek berbasis metodologi Scrum.	Kriteria: Kuantitatif Teknik: Tes & Non-Tes	Kuliah Mimbar		Yang dilakukan mahasiswa : PRESENTASI DOKUMEN	SCRUM PROJECT MANAGEMENT: - Scrum Team - Tahapan Scrum - Scrum Meeting	Bobot : 1%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
	penggunaan berbagai metodologi proyek khususnya Scrum serta dapat menyesuaikan untuk proyek dengan ruang lingkup yang tepat	2. Mahasiswa mampu membuat product backlog sesuai dengan cakupan proyek. 3. Mahasiswa mampu memecah product backlog kedalam sprint backlog secara relevan.		[TM: 2x50 menit]		EVALUASI PROYEK - Mendengarkan, membaca dan mempelajari bahan ajar, mencatat, - Mengerjakan latihan-latihan soal di buku atau di papan tulis, - Berdiskusi. Yang dilakukan dosen : - Menjelaskan di depan kelas, - membimbing mahasiswa dalam mengerjakan latihan-latihan soal, - Berdiskusi	- Product Backlog - Sprint Backlog	
16	Ujian Akhir Semester Sub-CPMK0416, Sub-CPMK0421, Sub-CPMK0424, Sub-CPMK0425, Sub-CPMK0431							

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Kegiatan Pembelajaran	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)
	Bobot: 30%							

Skema Analisis Instruksional

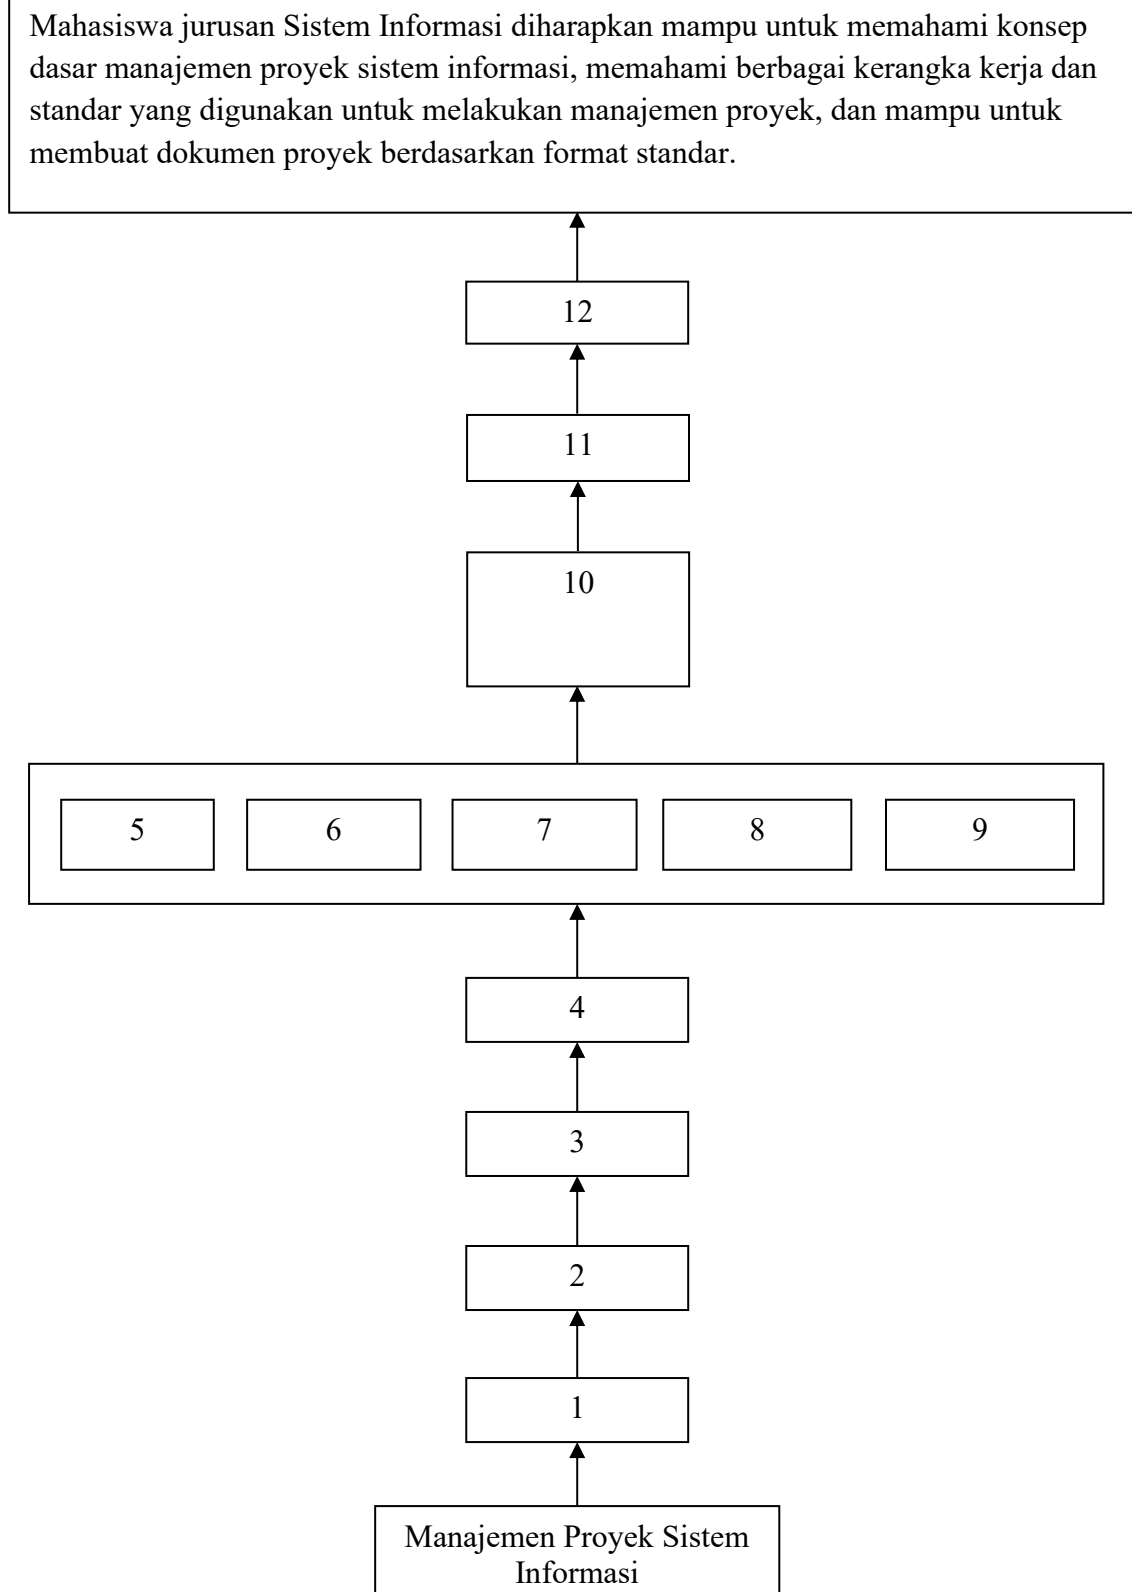

Keterangan Analisis Instruksional

No.	Capaian Pembelajaran
1	Mahasiswa mampu memahami Manajemen, Sistem Informasi, Proyek dan Program
2	Mahasiswa mampu memahami Kesuksesan Proyek dan Siklus Hidup Proyek
3	Mahasiswa mampu mendeskripsikan area pengetahuan manajemen proyek berdasarkan PMBOK
4	Mahasiswa mampu membuat dokumen Project Charter dan mendeskripsikan komponennnya dengan komprehensif sesuai dengan tema proyek sistem informasi yang diangkat.
5	Mahasiswa mampu memahami Perencanaan dan Penjadwalan Proyek (Manajemen Waktu)
6	Mahasiswa mampu memilih proyek berdasarkan perhitungan, Payback Period, Return on Investment, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Analisa Biaya Breakeven
7	Mahasiswa mampu membuat estimasi biaya dan penganggaran serta penjadwalan biaya dan peramalan
8	Memahami dan dapat menguraikan kembali Manajemen Resiko, Toleransi terhadap Resiko, Proses Manajemen Resiko
9	Menyusun dan menguraikan materi Pengendalian Proyek, yaitu Mengelola konflik dalam proyek yaitu Munculnya konflik, Manfaat adanya konflik, Pemecahan konflik
10	Memahami konsep dan metode Dasar Evaluasi Proyek seperti Tujuan, Keuntungan Evaluasi Proyek, Mengelola sebuah Evaluasi, dan Peran dan tanggung jawab evaluator
11	Mahasiswa dapat melakukan Praktek Evaluasi Proyek dengan kajian seperti Tahap Evaluasi Proyek, Dimensi kerja, Framework Evaluasi Proyek, Pemilihan Indikator, Identifikasi Sumber Daya Potensial
12	Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan berbagai metodologi proyek khususnya Scrum, serta dapat menyesuaikannya untuk proyek dengan ruang lingkup yang tepat

METODE ASESMEN PENCAPAIAN CPMK

CPMK	Metode Asesmen dan Persentase						
	Aktifitas	Tugas		Ujian Tertulis		Tugas	Total
	Kehadiran	Mandiri	Presentasi	UTS	UAS	Besar Kelompok	
CPMK041	2		2		20	8	32
CPMK042	3		2		15	8	28
CPMK043	2		2		15	8	27
CPMK091	3		2			8	13

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA (RTM) PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

2025

Universitas Tanjungpura

Mata Kuliah	: Manajemen Proyek SI	Kode MK	: SI – 3017
Tugas ke	: 1	Sks	: 2
Dosen pengampu	: Nurul Mutiah, S.T., M.T.	Semester	: 3

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA	
BENTUK TUGAS	
Tugas Kelompok	
JUDUL TUGAS	
Manajemen Integrasi Proyek Sistem Informasi	
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	
Mahasiswa mampu membuat dokumen awal proyek yakni Project Charter dan mendeskripsikan komponen secara tepat berdasarkan tema proyek Sistem Informasi yang diangkat	
DESKRIPSI TUGAS	
Membuat dokumen project charter berdasarkan studi kasus sistem informasi yang direncanakan untuk dikembangkan dalam sebuah perencanaan proyek sistem informasi.	
METODE Pengerjaan Tugas	
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara rinci sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi studi kasus proyek sistem informasi yang akan diangkat sebagai objek proyek. 2. Membuat dokumen project charter berdasarkan template yang dikeluarkan oleh Project Management Institute. 3. Setiap kelompok melakukan presentasi dokumen project charter.	
OBYEK DAN BENTUK LUARAN	
a. Obyek garapan: komponen pada project charter. b. Bentuk luaran : 1. Dokumen project charter proyek sistem informasi	
INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN	
Indikator Penilaian Tugas dan Penskoran	

No	Aspek yang Dinilai	Indikator
1	Latar Belakang & Tujuan Proyek	Menjelaskan secara jelas alasan proyek dibuat dan tujuan bisnis yang ingin dicapai.
2	Ruang Lingkup Proyek	Menguraikan batasan proyek, termasuk aktivitas yang termasuk dan tidak termasuk.
3	Pemangku Kepentingan Utama (Stakeholders)	Mengidentifikasi stakeholder proyek dan peran atau kontribusinya.
4	Manajer Proyek & Tim Proyek	Menyebutkan siapa yang bertanggung jawab serta susunan tim yang relevan.
5	Deliverables Proyek	Menjelaskan hasil/produk yang diharapkan dari proyek secara spesifik.
6	Jadwal dan Estimasi Waktu	Menyediakan rencana jadwal proyek secara umum (milestone utama).
7	Risiko Utama dan Strategi Mitigasi	Mengidentifikasi risiko utama dan langkah penanganannya secara realistis.
8	Sumber Daya dan Anggaran (jika ada)	Menyajikan estimasi kebutuhan sumber daya dan/atau biaya secara ringkas.
9	Format dan Kerapian Dokumen	Dokumen ditulis dengan bahasa profesional, sistematis, dan mudah dipahami.
Skor Maksimum: 100%		
JADWAL PELAKSANAAN		
7 Hari		Tanggal
LAIN-LAIN		
DAFTAR RUJUKAN		

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA (RTM)
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

2025

Universitas Tanjungpura

Mata Kuliah	: Manajemen Proyek SI	Kode MK	: SI – 3017
Tugas ke	: 2	Sks	: 2
Dosen pengampu	: Nurul Mutiah, S.T., M.T.	Semester	: 3

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA		
BENTUK TUGAS		
Tugas Kelompok		
JUDUL TUGAS		
Manajemen Penjadwalan Proyek Sistem Informasi		
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH		
Mahasiswa mampu membuat dokumen penjadwalan proyek sistem informasi dan mendeskripsikan komponen secara tepat berdasarkan tema proyek Sistem Informasi yang diangkat		
DESKRIPSI TUGAS		
Membuat dokumen penjadwalan proyek berdasarkan studi kasus sistem informasi yang direncanakan untuk dikembangkan dalam sebuah perencanaan proyek sistem informasi.		
METODE Pengerjaan Tugas		
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara rinci sebagai berikut. 1. Membuat dokumen penjadwalan proyek berdasarkan template yang dikeluarkan oleh Project Management Institute. 2. Setiap kelompok melakukan presentasi dokumen penjadwalan proyek.		
OBYEK DAN BENTUK LUARAN		
c. Obyek garapan: komponen pada dokumen penjadwalan proyek. d. Bentuk luaran : 2. Dokumen manajemen penjadwalan proyek sistem informasi		
INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN		
Indikator Penilaian Tugas dan Penskoran		
No	Komponen	Indikator Penilaian
1	Daftar Aktivitas Proyek	Memuat daftar lengkap dan logis dari semua aktivitas proyek utama dan sub-aktivitas yang relevan dengan tujuan proyek.

2	Deskripsi Aktivitas Proyek	Mencantumkan semua elemen deskripsi aktivitas secara lengkap, termasuk: deskripsi, aktivitas predesesor & suksesor, jenis hubungan (FS, SS, FF, dll), lead & lag, kebutuhan sumber daya, tanggal mulai, batasan, dan asumsi.
3	Work Breakdown Structure (WBS)	Struktur WBS disusun hierarkis dan mencerminkan penguraian proyek ke dalam komponen-komponen kerja yang lebih kecil dan terukur, serta mengikuti standar WBS (misalnya, berbasis deliverable).
4	Gantt Chart	Gantt Chart dibuat secara akurat dengan menampilkan urutan aktivitas, durasi, tanggal mulai dan selesai, serta ketergantungan antar aktivitas (dependency), dan dapat menunjukkan jalur kritis jika memungkinkan.
5	Kesesuaian Logika Jadwal	Jadwal antar aktivitas saling terkait secara logis dan realistis sesuai urutan kerja, lead/lag diperhitungkan dengan tepat, dan timeline menunjukkan estimasi waktu yang rasional.
6	Kelengkapan dan Kerapian Dokumen	Dokumen ditata secara sistematis, mudah dibaca, format tabel atau visual disajikan dengan rapi, dan konsisten di seluruh bagian.
7	Pemahaman Konseptual saat presentasi	Mahasiswa mampu menjelaskan logika penyusunan jadwal, justifikasi dependensi, serta alasan pemilihan asumsi dan batasan proyek.
Skor Maksimum: 100%		
JADWAL PELAKSANAAN		
7 Hari		Tanggal
LAIN-LAIN		
DAFTAR RUJUKAN		

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA (RTM) PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

2025

Universitas Tanjungpura

Mata Kuliah	: Manajemen Proyek SI	Kode MK	: SI – 3017
Tugas ke	: 3	Sks	: 2
Dosen pengampu	: Nurul Mutiah, S.T., M.T.	Semester	: 3

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA		
BENTUK TUGAS		
Tugas Kelompok		
JUDUL TUGAS		
Analisis Kelayakan Ekonomi Proyek		
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH		
Mahasiswa mampu membuat dokumen analisis kelayakan ekonomi proyek sistem informasi dan mendeskripsikan komponen secara tepat berdasarkan tema proyek Sistem Informasi yang diangkat		
DESKRIPSI TUGAS		
Membuat dokumen analisis kelayakan ekonomi proyek berdasarkan studi kasus sistem informasi yang direncanakan untuk dikembangkan dalam sebuah perencanaan proyek sistem informasi.		
METODE Pengerjaan Tugas		
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara rinci sebagai berikut.		
1. Membuat dokumen analisis kelayakan ekonomi proyek berdasarkan perhitungan kelayakan yang telah ditetapkan. 2. Satu kelompok melakukan presentasi dokumen penjadwalan proyek.		
OBYEK DAN BENTUK LUARAN		
e. Obyek garapan: komponen pada dokumen analisis kelayakan ekonomi proyek.		
f. Bentuk luaran :		
3. Dokumen analisis kelayakan ekonomi proyek sistem informasi		
INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN		
Indikator Penilaian Tugas dan Penskoran		
No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian
1	Identifikasi Biaya Proyek	Mahasiswa mampu mengidentifikasi seluruh komponen biaya proyek (biaya awal, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dll.) secara rinci dan realistis.

2	Identifikasi Manfaat (Benefit)	Menyebutkan manfaat proyek secara kuantitatif dan kualitatif, termasuk penghematan biaya, peningkatan efisiensi, produktivitas, dan/atau nilai tambah strategis.
3	Perhitungan Kelayakan Finansial	Mahasiswa menyajikan analisis kelayakan ekonomi dengan metode yang tepat, seperti: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period, Benefit-Cost Ratio (BCR), dll.
4	Asumsi Dasar Analisis	Menjelaskan secara eksplisit asumsi-asumsi yang digunakan (misal: tingkat diskonto, proyeksi pendapatan, inflasi, periode proyek), dan menunjukkan bahwa asumsi tersebut logis dan dapat dipertanggungjawabkan.
5	Analisis Sensitivitas (opsional)	Menunjukkan bagaimana perubahan asumsi atau parameter utama (misal: biaya naik 10%, manfaat turun 15%) memengaruhi hasil kelayakan proyek.
6	Interpretasi dan Kesimpulan	Menyimpulkan hasil analisis secara jelas dan memberikan rekomendasi berbasis data apakah proyek layak secara ekonomi atau tidak.
7	Kerapian dan Keterpaduan Dokumen	Dokumen disusun secara sistematis, tabel dan perhitu
Skor Maksimum: 100%		
JADWAL PELAKSANAAN		
7 Hari		Tanggal
LAIN-LAIN		
DAFTAR RUJUKAN		

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA (RTM) PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

2025

Universitas Tanjungpura

Mata Kuliah	: Manajemen Proyek SI	Kode MK	: SI – 3017
Tugas ke	: 4	Sks	: 2
Dosen pengampu	: Nurul Mutiah, S.T., M.T.	Semester	: 3

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA		
BENTUK TUGAS		
Tugas Kelompok		
JUDUL TUGAS		
Analisis Biaya Proyek Sistem Informasi menggunakan Function Point		
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH		
Mahasiswa mampu membuat dokumen perhitungan biaya proyek sistem informasi dan mendeskripsikan komponen secara tepat berdasarkan tema proyek Sistem Informasi yang diangkat		
DESKRIPSI TUGAS		
Membuat dokumen perhitungan biaya proyek berdasarkan studi kasus sistem informasi yang direncanakan untuk dikembangkan dalam sebuah perencanaan proyek sistem informasi.		
METODE Pengerjaan Tugas		
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara rinci sebagai berikut.		
1. Membuat dokumen perhitungan biaya proyek berdasarkan metode function point yang telah ditetapkan. 2. Satu kelompok melakukan presentasi dokumen penjadwalan proyek.		
OBYEK DAN BENTUK LUARAN		
a. Obyek garapan: komponen pada perhitungan proyek sistem informasi berdasarkan metode function point. b. Bentuk luaran : 1. Dokumen penilaian biaya proyek sistem informasi		
INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN		
Indikator Penilaian Tugas dan Penskoran		
N o	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian
1	Identifikasi Komponen Function Point	Mahasiswa mampu mengidentifikasi lima komponen utama FP (External Input, External Output, External Inquiry, Internal

		Logical File, External Interface File) secara lengkap dan akurat berdasarkan studi kasus.
2	Klasifikasi dan Bobot Komponen	Mahasiswa mampu menentukan tingkat kompleksitas (low, average, high) untuk masing-masing komponen FP dan menerapkan bobot yang sesuai berdasarkan standar IFPUG.
3	Perhitungan Unadjusted Function Point (UFP)	Mahasiswa menghitung total UFP secara benar dan menyajikannya dalam format tabel yang jelas.
4	Perhitungan Value Adjustment Factor (VAF)	Mahasiswa menilai 14 faktor penyesuaian secara rasional dan menjelaskan alasan penilaiannya, lalu menghitung VAF dengan benar.
5	Perhitungan Function Point Akhir (AFP)	Mahasiswa menghitung FP akhir ($AFP = UFP \times (0.65 + 0.01 \times VAF)$) dengan akurat.
6	Konversi ke Estimasi Usaha dan Biaya	Mahasiswa mengonversi hasil FP menjadi estimasi usaha (person-hours atau person-days) dan biaya berdasarkan asumsi tingkat produktivitas (misalnya 10 FP per person-month) dan tarif per jam atau bulan.
7	Asumsi dan Justifikasi	Mahasiswa menjelaskan asumsi yang digunakan (produktivitas, biaya tenaga kerja, kompleksitas sistem) dan mampu memberi justifikasi logis terhadap angka-angka yang digunakan.
8	Kerapian dan Keterpaduan Laporan	Hasil perhitungan dan penjelasan disusun secara sistematis, tabel rapi, dan format laporan profesional.
Skor Maksimum: 100%		
JADWAL PELAKSANAAN		
7 Hari		Tanggal
LAIN-LAIN		
DAFTAR RUJUKAN		

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA (RTM) PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

2025

Universitas Tanjungpura

Mata Kuliah	: Manajemen Proyek SI	Kode MK	: SI – 3017
Tugas ke	: 5	Sks	: 2
Dosen pengampu	: Nurul Mutiah, S.T., M.T.	Semester	: 3

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA		
BENTUK TUGAS		
Tugas Kelompok		
JUDUL TUGAS		
Manajemen Kualitas Proyek Sistem Informasi		
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH		
Mahasiswa mampu membuat dokumen manajemen kualitas proyek sistem informasi dan mendeskripsikan komponen secara tepat berdasarkan tema proyek Sistem Informasi yang diangkat		
DESKRIPSI TUGAS		
Membuat dokumen manajemen kualitas proyek berdasarkan studi kasus sistem informasi yang direncanakan untuk dikembangkan dalam sebuah perencanaan proyek sistem informasi.		
METODE Pengerjaan Tugas		
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara rinci sebagai berikut.		
1. Membuat dokumen manajemen kualitas proyek dengan memuat metrik penilaian kualitas proyek sistem informasi baik dari sisi produk sistem informasi maupun proses pelaksanaan proyek. 2. Satu kelompok melakukan presentasi dokumen manajemen kualitas proyek.		
OBYEK DAN BENTUK LUARAN		
c. Obyek garapan: komponen pada manajemen kualitas proyek sistem informasi yang memuat metrik penilaian kualitas proyek. d. Bentuk luaran : 2. Dokumen manajemen kualitas proyek sistem informasi		
INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN		
Indikator Penilaian Tugas dan Penskoran		
No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian
1	Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen Kualitas	Mahasiswa menjelaskan secara jelas dan ringkas tujuan manajemen kualitas serta

		cakupan aspek produk dan proses proyek TI.
2	Metrik Kualitas Produk Sistem Informasi	Mahasiswa menyusun metrik kualitas produk secara terukur, misalnya: – <i>Reliability</i> (MTBF, failure rate) – <i>Usability</i> (user error rate, task completion time) – <i>Performance</i> (response time, throughput) – <i>Functionality</i> (coverage terhadap kebutuhan fungsional) – <i>Maintainability</i> (modularitas, kemudahan perbaikan)
3	Metrik Kualitas Proses Proyek	Mahasiswa menyusun metrik proses pelaksanaan proyek, seperti: – Ketepatan waktu penyelesaian milestone – Persentase penyelesaian sesuai rencana – Jumlah perubahan scope (scope creep) – Kesesuaian dengan standar dokumentasi dan prosedur – Tingkat revisi/penolakan dokumen
4	Rencana Pengendalian Kualitas	Menjelaskan metode dan alat untuk memantau serta menjamin kualitas, misalnya: checklist, audit kualitas, review dokumen, pengujian sistem, dan corrective action plan.
5	Penanggung Jawab Mutu (Quality Roles)	Mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrol mutu, review, dan validasi produk dan proses.
6	Pendekatan Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement)	Mencakup rencana untuk mengumpulkan umpan balik, melakukan analisis akar masalah (root cause analysis), dan perbaikan proses (plan-do-check-act / PDCA).
7	Keterpaduan dan Profesionalisme Dokumen	Dokumen ditulis dengan struktur yang jelas, bahasa formal, sistematis, dan menyertakan tabel metrik serta grafik jika diperlukan.

Skor Maksimum: 100%

JADWAL PELAKSANAAN

7 Hari

Tanggal

LAIN-LAIN

DAFTAR RUJUKAN

--

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA (RTM) PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

2025

Universitas Tanjungpura

Mata Kuliah	: Manajemen Proyek SI	Kode MK	: SI – 3017
Tugas ke	: 6	Sks	: 2
Dosen pengampu	: Nurul Mutiah, S.T., M.T.	Semester	: 3

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA		
BENTUK TUGAS		
Tugas Kelompok		
JUDUL TUGAS		
Manajemen Resiko Proyek Sistem Informasi		
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH		
Mahasiswa mampu membuat dokumen manajemen resiko proyek sistem informasi dan mendeskripsikan komponen secara tepat berdasarkan tema proyek Sistem Informasi yang diangkat		
DESKRIPSI TUGAS		
Membuat dokumen manajemen resiko proyek berdasarkan studi kasus sistem informasi yang direncanakan untuk dikembangkan dalam sebuah perencanaan proyek sistem informasi.		
METODE Pengerjaan Tugas		
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara rinci sebagai berikut.		
1. Membuat dokumen manajemen resiko proyek dengan memuat aspek identifikasi, penilaian, dan rencana mitigasi resiko pelaksanaan proyek sistem informasi. 2. Satu kelompok melakukan presentasi dokumen manajemen resiko proyek.		
OBYEK DAN BENTUK LUARAN		
e. Obyek garapan: komponen pada manajemen resiko proyek sistem informasi yang memuat identifikasi, penilaian, dan rencana mitigasi resiko. f. Bentuk luaran : 3. Dokumen manajemen resiko proyek sistem informasi		
INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN		
Indikator Penilaian Tugas dan Penskoran		
N o	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian
1	Identifikasi Risiko	Mahasiswa mampu mengidentifikasi risiko-risiko utama secara menyeluruh dari aspek teknis, operasional, manajerial, sumber

		daya, keamanan, dan pihak ketiga berdasarkan studi kasus sistem informasi yang dikembangkan.
2	Klasifikasi Risiko	Mahasiswa mengelompokkan risiko berdasarkan kategori (misal: risiko teknis, risiko jadwal, risiko biaya, risiko kualitas, risiko SDM) secara jelas dan sistematis.
3	Penilaian Dampak dan Probabilitas	Mahasiswa memberikan skala penilaian untuk masing-masing risiko (tingkat dampak dan kemungkinan terjadi), serta menjelaskan alasan atau asumsi dari penilaian tersebut.
4	Matriks Risiko (Risk Matrix)	Mahasiswa menyusun matriks risiko (misal: 3x3 atau 5x5) untuk memetakan risiko berdasarkan kombinasi dampak dan probabilitas.
5	Strategi Penanganan Risiko	Mahasiswa menentukan strategi mitigasi atau respons untuk setiap risiko (avoid, mitigate, transfer, accept) dan menjelaskan rencana tindakan spesifik.
6	Pemantauan dan Pengendalian Risiko	Dokumen mencakup rencana bagaimana risiko akan dimonitor selama proyek berlangsung, termasuk indikator risiko dan mekanisme pelaporan.
7	Penanggung Jawab (Risk Owner)	Mahasiswa mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab menangani atau memantau risiko tertentu.
8	Keterkaitan Risiko dengan Studi Kasus	Risiko yang disusun sesuai dengan konteks sistem informasi yang direncanakan, bukan generik atau di luar relevansi kasus.
9	Kerapian dan Profesionalisme Dokumen	Dokumen tersusun rapi, lengkap, dan menggunakan format manajemen risiko profesional (tabel risiko, grafik risiko, dan narasi pendukung).
Skor Maksimum: 100%		
JADWAL PELAKSANAAN		
7 Hari		Tanggal
LAIN-LAIN		
DAFTAR RUJUKAN		

**UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GAZAL TAHUN AJARAN 2024/2025**

Nama Mata Kuliah : Manajemen Proyek Sistem Informasi

Pengampu : Nurul Mutiah, S.T., M.T.

SKS : 2 SKS

Program Studi : Sistem Informasi

Sifat : Tutup Buku

Hari/Tanggal :


Waktu :

Kelas :

PETUNJUK Pengerjaan

- a) Kerjakan semua soal pada lembar jawaban dan tuliskan identitas Saudara secara jelas dan singkat
- b) Tulisan hendaknya jelas dan terbaca, serta sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

Pertanyaan

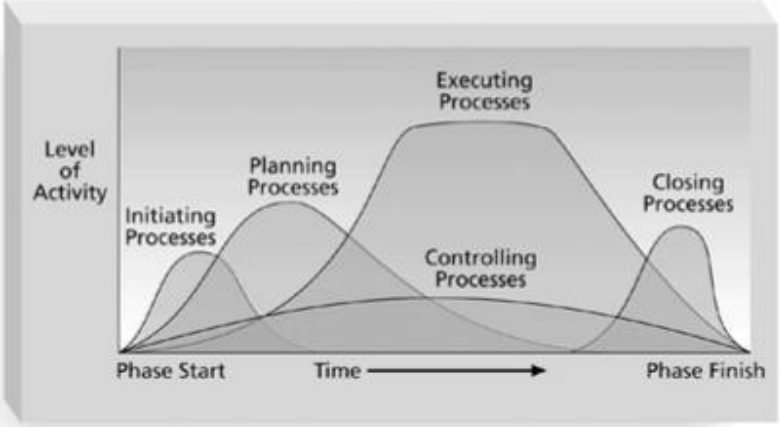1.	Jelaskan definisi proyek dan manajemen proyek sistem informasi! (10%)
2.	Jelaskan hubungan dari segitiga manajemen proyek (Project Management Triangle). (10%)
3.	Jelaskan 5 Kelompok Proses Manajemen Proyek berdasarkan gambar berikut. (15%) 
4.	Deskripsikan Project Charter dari proyek studi kasus masing-masing dengan bagiannya yaitu: Project and Product Overview, Justification (Business Need), Objectives, High Level Requirement, Major Deliverable. (25%)
6.	Dari studi kasus maka lakukan hal berikut (40%): 1. Analisis Periode Pengembalian (Payback Peroid) dan penjelasannya 2. Analisis Pengembalian Investasi (Return on Investment) dan penjelasannya 3. Analisis Nilai Bersih Saat ini (Net Present value) dengan suku bunga 15% dan penjelasannya 4. Analisis Internal Rate of Return (IRR) dan penjelasannya Buatlah juga kesimpulan apakah proyek layak dijalankan atau tidak. Rumus yang digunakan:

PP = n + (TM n+1 – Proceed n)/ Proceed n+1 X 1 Tahun

$$ROI = \frac{TotalManfaat - TotalBiaya}{TotalBiaya} \times 100\%$$

$$NPV = -Nilai Pr oyek + \frac{Proceed1}{(1+i\%)^1} + \frac{Proceed2}{(1+i\%)^2} + \dots + \frac{Proceedn}{(1+i\%)^n}$$

$$IRR = i_1 + \frac{(i_2 - i_1) \cdot NPV_1}{NPV_1 - NPV_2}$$

Rincian Biaya dan Manfaat				
Rincian biaya dan manfaat Tahun ke-2	Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3
Rincian Biaya				
Biaya pengembangan sistem				
Pembelian lisensi software	3.000.000			
CPU	7.700.000			
Printer	2.000.000			
Gaji Programmer	55.500.000			
Biaya pelatihan	8.000.000			
Biaya pemeliharaan		4.500.000	4.750.000	6.150.000
Total Biaya (TB)	76.200.000	4.500.000	4.750.000	6.150.000
Rincian Manfaat				
1. Manfaat wujud				
Pengurangan-pengurangan biaya operasi.		3.000.000	4.550.000	7.750.000
Pengurangan kesalahan-kesalahan proses.		4.100.000	5.450.000	6.100.000
Pengurangan biaya telekomunikasi		1.350.000	1.560.000	2.100.000
Total Wujud (TW)		8.450.000	11.560.000	15.950.000
2. Manfaat Tak Wujud				
Peningkatan pelayanan lebih baik kepada langganan.		10.500.000	15.500.000	18.500.000
Peningkatan kepuasan kerja personil.		2.100.000	2.670.000	3.420.000
Peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik		5.640.000	7.890.000	9.050.000
Total Tak wujud (TTW)		18.240.000	26.060.000	30.970.000
Total Manfaat TM		26.690.000	37.620.000	46.920.000
Proceed (Selisih TM & TB)		22.190.000	32.870.000	40.770.000

**UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2024/2025**

Nama Mata Kuliah : Manajemen Proyek Sistem Informasi

Pengampu : Nurul Mutiah, S.T., M.T.

SKS : 2 SKS

Program Studi : Sistem Informasi

Sifat : Tutup Buku

Hari/Tanggal :

Waktu :

Kelas :

PETUNJUK Pengerjaan

- a) *Kerjakan semua soal pada lembar jawaban dan tuliskan identitas Saudara secara jelas dan singkat*
- b) *Tulisan hendaknya jelas dan terbaca, serta sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*

Pertanyaan

No	Soal dan Bobot Poin	Capaian CPMK
1	Susunlah output dari penjadwalan proyek Sistem Informasi Pengaduan Kekerasan Seksual Lingkungan Universitas Tanjungpura yang berisi (15%): a. Activity List (Minimal 6) b. Activity Attributes untuk tiap Activity List c. Milestone List	CPMK071
2	Berdasarkan proyek kelompok masing-masing, identifikasi 5 metrik kualitas, disertai dengan rencana mengukur kualitas, metode pengukuran, metode pengumpulan data, dan waktu mengukur kualitas (20%)	CPMK071
3	Sebutkan dan jelaskan 3 produk yang dapat dijadikan objek evaluasi proyek. Buat juga pertanyaan evaluasi atas setiap produk tersebut. (10%)	CPMK071
4	Berdasarkan 3 produk diatas, buatlah 3 indikator kinerja, elemen data, sumberdata, metode pengumpulan data, partisipan, tanggal mulai, dan tanggal selesai evaluasi proyek. (15%)	CPMK071
5	Jelaskan minimal 3 perbedaan mendasar dalam pengembangan proyek antara metodologi Scrum dan metodologi klasik (Waterfall). (10%)	CPMK071
6	Susunlah sebuah Product Backlog dari sebuah proyek pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Tanjungpura, minimal berisi 5 item dengan format Order, Id, Item, Type, Status, Estimated. (15%)	CPMK072

7	Berdasarkan Product Backlog yang telah dibuat, susun sebuah Sprint Backlog yang berisi minimal 2 Product Backlog yang masing-masingnya berisi 5 item. Format Sprint Backlog adalah User Story (Product Backlog), Task, Day 1....Day N. (15%)	CPMK072
---	--	---------
